

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 M2 NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS				DATA : 18/07/2024 BDI : 26,87%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 M2 NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS				FONTE VERSÃO HORA MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE APUIARÉS				SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
	CLIENTE:	CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU				SINAPI 2023/11 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

VALOR DO CONTRATO	R\$	312.413,30
VALOR DO ADITIVO	-R\$	23.601,36
VALOR REPLANILHADO	R\$	288.811,94
MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR	R\$	219.388,67
MEDICÃO ATUAL	R\$	69.423,27
MEDICÃO ACUMULADA ATUAL	R\$	288.811,94
SALDO CONTRATUAL	R\$	-

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 28/07/2025 A 15/08/2025

5ª MEDIÇÃO																		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE				VALOR			INDICADORES PERCENTUAIS			
					SEM BDI	COM BDI		MEDIDA NO PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDA ACUMULADA	SALDO	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 18.502,87					R\$	-	R\$ 18.502,87	R\$ 18.502,87	0,00%	100,00%	100,00%
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	4,00	R\$ 367,87	R\$ 466,72	R\$ 1.866,88	0,00	4,00	4,00	-	R\$	-	R\$ 1.866,88	R\$ 1.866,88	0,00%	100,00%	100,00%
1.2	73672.	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	7.492,00	R\$ 0,49	R\$ 0,62	R\$ 4.645,04	0,00	7.492,00	7.492,00	-	R\$	-	R\$ 4.645,04	R\$ 4.645,04	0,00%	100,00%	100,00%
1.3	100983	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.123,80	R\$ 8,41	R\$ 10,67	R\$ 11.990,95	0,00	1.123,80	1.123,80	-	R\$	-	R\$ 11.990,95	R\$ 11.990,95	0,00%	100,00%	100,00%
2	CERCAMENTO E DIVISÓRIAS						R\$ 165.721,07					R\$	-	R\$ 165.721,07	R\$ 165.721,07	0,00%	100,00%	100,00%
2.3	74238/002.	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	10,00	R\$ 920,99	R\$ 1.168,46	R\$ 11.684,60	0,00	10,00	10,00	-	R\$	-	R\$ 11.684,60	R\$ 11.684,60	0,00%	100,00%	100,00%
2.4	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	351,00	R\$ 103,12	R\$ 130,83	R\$ 45.921,33	0,00	351,00	351,00	-	R\$	-	R\$ 45.921,33	R\$ 45.921,33	0,00%	100,00%	100,00%
2.5	C0733	CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - F	M	300,50	R\$ 283,58	R\$ 359,78	R\$ 108.115,14	0,00	300,50	300,50	-	R\$	-	R\$ 108.115,14	R\$ 108.115,14	0,00%	100,00%	100,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 59.433,74											
4.1	ESTRADA DE ENERGIA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA						R\$ 28.071,85					R\$	28.071,85	R\$ -	R\$ 28.071,85	100,00%	0,00%	100,00%
4.1.1	101490	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 1.320,86	R\$ 1.675,78	R\$ 1.675,78	1,00	-	1,00	-	R\$	1.675,78	R\$ -	R\$ 1.675,78	100,00%	0,00%	100,00%
4.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	29,25	R\$ 73,66	R\$ 93,45	R\$ 2.733,41	29,25	-	29,25	-	R\$	2.733,41	R\$ -	R\$ 2.733,41	100,00%	0,00%	100,00%
4.1.3	96995.	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	29,25	R\$ 44,66	R\$ 56,66	R\$ 1.657,31	29,25	-	29,25	-	R\$	1.657,31	R\$ -	R\$ 1.657,31	100,00%	0,00%	100,00%
4.1.4	74166/001.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R\$ 211,24	R\$ 268,00	R\$ 4.020,00	15,00	-	15,00	-	R\$	4.020,00	R\$ -	R\$ 4.020,00	100,00%	0,00%	100,00%
4.1.5	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	189,00	R\$ 21,54	R\$ 27,33	R\$ 5.165,37	189,00	-	189,00	-	R\$	5.165,37	R\$ -	R\$ 5.165,37	100,00%	0,00%	100,00%
4.1.6	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	45,00	R\$ 37,01	R\$ 46,95	R\$ 2.112,75	45,00	-	45,00	-	R\$	2.112,75	R\$ -	R\$ 2.112,75	100,00%	0,00%	100,00%
4.1.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	R\$ 5,93	R\$ 7,52	R\$ 225,60	30,00	-	30,00	-	R\$	225,60	R\$ -	R\$ 225,60	100,00%	0,00%	100,00%
4.1.8	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	315,00	R\$ 7,77	R\$ 9,86	R\$ 3.105,90	315,00	-	315,00	-	R\$	3.105,90	R\$ -	R\$ 3.105,90	100,00%	0,00%	100,00%
4.1.9	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	R\$ 20,04	R\$ 25,42	R\$ 4.575,60	180,00	-	180,00	-	R\$	4.575,60	R\$ -	R\$ 4.575,60	100,00%	0,00%	100,00%
4.1.10	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 33,54	R\$ 42,55	R\$ 42,55	1,00	-	1,00	-	R\$	42,55	R\$ -	R\$ 42,55	100,00%	0,00%	100,00%
4.1.11	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 291,58	R\$ 369,93	R\$ 369,93	1,00	-	1,00	-	R\$	369,93	R\$ -	R\$ 369,93	100,00%	0,00%	100,00%
4.1.12	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	5,00	R\$ 22,96	R\$ 29,13	R\$ 145,65	5,00	-	5,00	-	R\$	145,65	R\$ -	R\$ 145,65	100,00%	0,00%	100,00%
4.1.13	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	190,00	R\$ 9,30	R\$ 11,80	R\$ 2.242,00	190,00	-	190,00	-	R\$	2.242,00	R\$ -	R\$ 2.242,00	100,00%	0,00%	100,00%
4.2	ILUMINAÇÃO EXTERNA						R\$ 31.361,89					R\$	6.057,16	R\$ 25.304,73	R\$ 31.361,89	19,31%	80,69%	100,00%
4.2.1	83399.	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 52,06	R\$ 66,05	R\$ 330,25	1,00	4,00	5,00	-	R\$	66,05	R\$ 264,20	R\$ 330,25	20,00%	80,00%	100,00%
4.2.2	C4983	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	5,00	R\$ 4.722,24	R\$ 5.991,11	R\$ 29.955,55	1,00	4,00	5,00	-	R\$	5.991,11	R\$ 23.964,44	R\$ 29.955,55	20,00%	80,00%	100,00%
4.2.3	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	R\$ 848,18	R\$ 1.076,09	R\$ 1.076,09	0,00	1,00	1,00	-	R\$	-	R\$ 1.076,09	R\$ 1.076,09	0,00%	100,00%	100,00%
8	GUARITA						R\$ 27.266,59											
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.906,63					R\$	-	R\$ 2.906,63	R\$ 2.906,63	0,00%	100,00%	100,00%
8.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,12	R\$ 51,93	R\$ 65,88	R\$ 2.906,63	0,00	44,12	44,12	-	R\$	-	R\$ 2.906,63	R\$ 2.906,63	0,00%	100,00%	100,00%

ELTON JOHN
DE SOUSA
NOGUEIRA:0531121360
11121360

Assinado digitalmente por ELTON JOHN DE SOUSA NOGUEIRA:0531121360
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=ELTON JOHN DE SOUSA NOGUEIRA:0531121360
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

8.2	FUNDAÇÕES						R\$ 1.561,42					R\$ -	R\$ 1.561,42	R\$ 1.561,42	0,00%	100,00%	100,00%
8.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	M3	1,87	R\$ 73,66	R\$ 93,45	R\$ 174,75	0,00	1,87	1,87	-	R\$ -	R\$ 174,75	R\$ 174,75	0,00%	100,00%	100,00%
8.2.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,01	R\$ 640,90	R\$ 813,11	R\$ 821,24	0,00	1,01	1,01	-	R\$ -	R\$ 821,24	R\$ 821,24	0,00%	100,00%	100,00%
8.2.3	C0829	CONCRETO CICLOPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,86	R\$ 518,23	R\$ 657,48	R\$ 565,43	0,00	0,86	0,86	-	R\$ -	R\$ 565,43	R\$ 565,43	0,00%	100,00%	100,00%
8.3	ESTRUTURA						R\$ 2.512,97					R\$ -	R\$ 2.512,97	R\$ 2.512,97	0,00%	100,00%	100,00%
8.3.1	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	14,00	R\$ 116,34	R\$ 147,60	R\$ 2.066,40	0,00	14,00	14,00	-	R\$ -	R\$ 2.066,40	R\$ 2.066,40	0,00%	100,00%	100,00%
8.3.2	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	2,88	R\$ 122,22	R\$ 155,06	R\$ 446,57	0,00	2,88	2,88	-	R\$ -	R\$ 446,57	R\$ 446,57	0,00%	100,00%	100,00%
8.4	PAREDES						R\$ 2.878,99					R\$ -	R\$ 2.878,99	R\$ 2.878,99	0,00%	100,00%	100,00%
8.4.1	103321	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	M2	20,18	R\$ 109,91	R\$ 139,44	R\$ 2.813,90	0,00	20,18	20,18	-	R\$ -	R\$ 2.813,90	R\$ 2.813,90	0,00%	100,00%	100,00%
8.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,03	R\$ 1.710,13	R\$ 2.169,64	R\$ 65,09	0,00	0,03	0,03	-	R\$ -	R\$ 65,09	R\$ 65,09	0,00%	100,00%	100,00%
8.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE						R\$ 1.440,68					R\$ 1.440,68	R\$ -	R\$ 1.440,68	100,00%	0,00%	100,00%
8.5.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	10,32	R\$ 100,51	R\$ 127,52	R\$ 1.316,01	10,32	-	10,32	-	R\$ 1.316,01	R\$ -	R\$ 1.316,01	100,00%	0,00%	100,00%
8.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	10,32	R\$ 9,52	R\$ 12,08	R\$ 124,67	10,32	-	10,32	-	R\$ 124,67	R\$ -	R\$ 124,67	100,00%	0,00%	100,00%
8.6	PISO						R\$ 5.347,83					R\$ 5.347,83	R\$ -	R\$ 5.347,83	100,00%	0,00%	100,00%
8.6.1	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	2,09	R\$ 51,98	R\$ 65,95	R\$ 137,84	2,09	-	2,09	-	R\$ 137,84	R\$ -	R\$ 137,84	100,00%	0,00%	100,00%
8.6.2	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	26,82	R\$ 10,25	R\$ 13,00	R\$ 348,66	26,82	-	26,82	-	R\$ 348,66	R\$ -	R\$ 348,66	100,00%	0,00%	100,00%
8.6.3	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	2,15	R\$ 762,66	R\$ 967,59	R\$ 2.080,32	2,15	-	2,15	-	R\$ 2.080,32	R\$ -	R\$ 2.080,32	100,00%	0,00%	100,00%
8.6.4	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	26,82	R\$ 23,53	R\$ 29,85	R\$ 800,58	26,82	-	26,82	-	R\$ 800,58	R\$ -	R\$ 800,58	100,00%	0,00%	100,00%
8.6.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	23,94	R\$ 51,90	R\$ 65,85	R\$ 1.576,45	23,94	-	23,94	-	R\$ 1.576,45	R\$ -	R\$ 1.576,45	100,00%	0,00%	100,00%
8.6.6	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_ 09/2021	M2	26,82	R\$ 0,61	R\$ 0,77	R\$ 20,65	26,82	-	26,82	-	R\$ 20,65	R\$ -	R\$ 20,65	100,00%	0,00%	100,00%
8.6.7	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,88	R\$ 95,39	R\$ 121,02	R\$ 348,54	2,88	-	2,88	-	R\$ 348,54	R\$ -	R\$ 348,54	100,00%	0,00%	100,00%
8.6.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	2,88	R\$ 9,52	R\$ 12,08	R\$ 34,79	2,88	-	2,88	-	R\$ 34,79	R\$ -	R\$ 34,79	100,00%	0,00%	100,00%
8.7	PINTURA						R\$ 490,14					R\$ 490,14	R\$ -	R\$ 490,14	100,00%	0,00%	100,00%
8.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	29,14	R\$ 3,47	R\$ 4,40	R\$ 128,22	29,14	-	29,14	-	R\$ 128,22	R\$ -	R\$ 128,22	100,00%	0,00%	100,00%
8.7.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	29,14	R\$ 9,79	R\$ 12,42	R\$ 361,92	29,14	-	29,14	-	R\$ 361,92	R\$ -	R\$ 361,92	100,00%	0,00%	100,00%
8.8	COBERTA						R\$ 3.627,02					R\$ 3.627,02	R\$ -	R\$ 3.627,02	100,00%	0,00%	100,00%
8.8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	17,36	R\$ 101,92	R\$ 129,31	R\$ 2.244,82	17,36	-	17,36	-	R\$ 2.244,82	R\$ -	R\$ 2.244,82	100,00%	0,00%	100,00%
8.8.2	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	17,36	R\$ 62,76	R\$ 79,62	R\$ 1.382,20	17,36	-	17,36	-	R\$ 1.382,20	R\$ -	R\$ 1.382,20	100,00%	0,00%	100,00%
8.9	ESQUADRIAS						R\$ 2.069,47					R\$ 2.069,47	R\$ -	R\$ 2.069,47	100,00%	0,00%	100,00%
8.9.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,20	R\$ 280,82	R\$ 356,28	R\$ 427,54	1,20	-	1,20	-	R\$ 427,54	R\$ -	R\$ 427,54	100,00%	0,00%	100,00%
8.9.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	1,20	R\$ 161,52	R\$ 204,92	R\$ 245,90	1,20	-	1,20	-	R\$ 245,90	R\$ -	R\$ 245,90	100,00%	0,00%	100,00%
8.9.3	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	2,52	R\$ 436,65	R\$ 553,98	R\$ 1.396,03	2,52	-	2,52	-	R\$ 1.396,03	R\$ -	R\$ 1.396,03	100,00%	0,00%	100,00%
8.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 3.767,65					R\$ 3.767,65	R\$ -	R\$ 3.767,65	100,00%	0,00%	100,00%
8.10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	R\$ 604,02	R\$ 766,32	R\$ 766,32	1,00	-	1,00	-	R\$ 766,32	R\$ -	R\$ 766,32	100,00%	0,00%	100,00%
8.10.2	C3598	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 243,16	R\$ 308,50	R\$ 308,50	1,00	-	1,00	-	R\$ 308,50	R\$ -	R\$ 308,50	100,00%	0,00%	100,00%
8.10.3	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	1,00	R\$ 54,28	R\$ 68,87	R\$ 68,87	1,00	-	1,00	-	R\$ 68,87	R\$ -	R\$ 68,87	100,00%	0,00%	100,00%
8.10.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	R\$ 248,26	R\$ 314,97	R\$ 944,91	3,00	-	3,00	-	R\$ 944,91	R\$ -	R\$ 944,91	100,00%	0,00%	100,00%
8.10.5	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	R\$ 231,63	R\$ 293,87	R\$ 881,61	3,00	-	3,00	-	R\$ 881,61	R\$ -	R\$ 881,61	100,00%	0,00%	100,00%
8.10.6	C0602	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 628,55	R\$ 797,44	R\$ 797,44	1,00	-	1,00	-	R\$ 797,44	R\$ -	R\$ 797,44	100,00%	0,00%	100,00%
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 663,79					R\$ 663,79	R\$ -	R\$ 663,79	100,00%	0,00%	100,00%
8.11.1	93128.	PONTO DE ILUMINAÇÃO PRESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF_ 01/2016	UN	2,00	R\$ 144,65	R\$ 183,52	R\$ 367,04	2,00	-	2,00	-	R\$ 367,04	R\$ -	R\$ 367,04	100,00%	0,00%	100,00%
8.11.2	93141.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_ 01/2016	UN	1,00	R\$ 174,00	R\$ 220,75	R\$ 220,75	1,00	-	1,00	-	R\$ 220,75	R\$ -	R\$ 220,75	100,00%	0,00%	100,00%
8.11.3	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2022	UN	2,00	R\$ 29,95	R\$ 38,00	R\$ 76,00	2,00	-	2,00	-	R\$ 76,00	R\$ -	R\$ 76,00	100,00%	0,00%	100,00%

9	SINALIZAÇÃO INTERNA (COMUNICAÇÃO VISUAL)						R\$ 12.553,36					R\$ 12.553,36	R\$ -	R\$ 12.553,36	100,00%	0,00%	100,00%
9.1	COMP_RS_04	SINALIZAÇÃO VERTICAL - BARROTE MADEIRA SIMPLES	UND	15,00	R\$ 81,75	R\$ 103,72	R\$ 1.555,80	15,00	-	15,00	-	R\$ 1.555,80	R\$ -	R\$ 1.555,80	100,00%	0,00%	100,00%
9.2	COMP_RS_05	SINALIZAÇÃO VERTICAL - BARROTE MADEIRA DUPLA	UND	4,00	R\$ 154,96	R\$ 196,60	R\$ 786,40	4,00	-	4,00	-	R\$ 786,40	R\$ -	R\$ 786,40	100,00%	0,00%	100,00%
9.3	C3629	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA CESTROTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRACADEIRAS	M2	10,44	R\$ 770,93	R\$ 978,08	R\$ 10.211,16	10,44	-	10,44	-	R\$ 10.211,16	R\$ -	R\$ 10.211,16	100,00%	0,00%	100,00%
10	SISTEMA E PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO						R\$ 5.334,30					R\$ 5.334,30	R\$ -	R\$ 5.334,30	100,00%	0,00%	100,00%
10.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	5,00	R\$ 774,82	R\$ 983,01	R\$ 4.915,05	5,00	-	5,00	-	R\$ 4.915,05	R\$ -	R\$ 4.915,05	100,00%	0,00%	100,00%
10.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	5,00	R\$ 51,85	R\$ 65,78	R\$ 328,90	5,00	-	5,00	-	R\$ 328,90	R\$ -	R\$ 328,90	100,00%	0,00%	100,00%
10.3	C4550	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	M2	0,20	R\$ 356,09	R\$ 451,77	R\$ 90,35	0,20	-	0,20	-	R\$ 90,35	R\$ -	R\$ 90,35	100,00%	0,00%	100,00%
							VR TOTAL:	R\$ 288.811,94				R\$ 69.423,27	R\$ 219.388,67	R\$ 288.811,94	24,04%	75,96%	100,00%

Documento assinado digitalmente



IAGO ARAUJO BARBOSA
Data: 21/08/2025 14:52:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELTON JOHN
DE SOUSA
NOGUEIRA:05311121360

Assinado digitalmente por ELTON JOHN DE SOUSA NOGUEIRA:05311121360
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=ELTON JOHN DE SOUSA NOGUEIRA:05311121360
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e					Número da Nota 00513												
Data da Emissão		20/08/2025 17:21:16		Competência		08/2025		Cód. Verificação		2EA48594C									
RPS Nº				NFS-e substituída				Local da Prestação		APUIARÉS - CE									
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
		Razão Social/Nome		M A FEITOSA DE SOUSA LTDA															
		CPF/CNPJ		41.356.135/0001-71		Inscrição Municipal		203000306		Inscrição Estadual									
		Município		BOA VIAGEM - CE						CEP		63.870-000							
		Endereço		R JOAO INACIO DE CARVALHO ,000126 - VILA AZUL															
		Complemento		1ºANDAR, SALA 02															
		E-mail		MSCONSTRUCOESBV@GMAIL.COM						Telefone		(88)9688-2269							
DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS																			
Razão Social/Nome		CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU																	
CPF/CNPJ		37.568.608/0001-27				Inscrição Municipal				Inscrição Estadual									
Município		PENTECOSTE - CE						CEP		62.640-000									
Endereço		PC BERNARDINO GOMES BEZERRA ,457 - CENTRO																	
Complemento						Tel.				E-mail									
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS																			
CPF/CNPJ				Razão Social/Nome															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
NFS REF 5º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE RESIDUOS COM ÁREA DE 7500 M2 NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE																			
CONTRATO Nº 2024101501																			
PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/07/2025 À 15/08/2025																			
VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 69.423,27 VALOR DA MÃO DE OBRA 30% R\$ 20.826,98 VALOR DO MATERIAL 70% R\$ 48.596,29																			
M A FEITOSA DE SOUSA ME EPP AG: 153 C/C: 045758-9 BANCO DO NORDESTE																			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE																			
412040001-CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS																			
07.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E																			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL																			
Descrição da Obra									Código ART										
TRIBUTOS FEDERAIS																			
PIS(R\$)		0,00		COFINS(R\$)		0,00		IRRF(R\$)		833,08		INSS(R\$)		2.290,97		CSLL(R\$)		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços										Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços(R\$)		69.423,27		Natureza Operação		Valor dos Serviços(R\$)				69.423,27									
(-)Desconto Incondicionado(R\$)		0,00		 Documento assinado digitalmente IAGO ARAUJO BARBOSA Data: 21/08/2025 14:52:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		Retenções Permitidas em Lei(R\$)				48.596,29									
(-)Desconto Condicionado(R\$)		0,00				Desconto Incondicionado(R\$)				0,00									
(-)Retenções Federais(R\$)		3.124,05				Retenção e Cálculo(R\$)				20.826,98									
(-)Outras Retenções(R\$)		0,00		Opção Simples Nacional		(X)Alíquota %				5,00									
(-)ISS Retido(R\$)		1.041,35		Não		ISS a reter				(X) Sim () Não									
(=)Valor Líquido(R\$)		65.257,87				(=)Valor do ISS(R\$)				1.041,35									
Avisos		Esta Nota Fiscal foi emitida com respaldo na Lei Nº 1.353 de 20 de Dezembro de 2017. Para validar a nota acesse: https://boaviagem.ssinformatica.net/nfe/validar																	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU

EMPRESA EXECUTANTE: M A FEITOSA DE SOUSA LTDA

CNPJ: 41.356.135/0001-71

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7500 M2 NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO



PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER



ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPÔR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS



ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021



CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELTON JOHN
DE SOUSA
NOGUEIRA:0
5311121360

Assinado digitalmente por ELTON
JOHN DE SOUSA
NOGUEIRA:05311121360
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=ELTON JOHN DE SOUSA
NOGUEIRA:05311121360
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO



DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A



LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE



CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA
ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE



REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS
(PAREDE/PISO)



CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa,
INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA



PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR ESP. 2,0 cm



CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO



REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS
(PAREDE/PISO)



PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023



MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)



TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%



JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM



PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)




BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA

ELTON JOHN
DE SOUSA
NOGUEIRA:0
5311121360

Assinado digitalmente por ELTON
JOHN DE SOUSA
NOGUEIRA:05311121360
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=ELTON JOHN DE SOUSA
NOGUEIRA:05311121360
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR

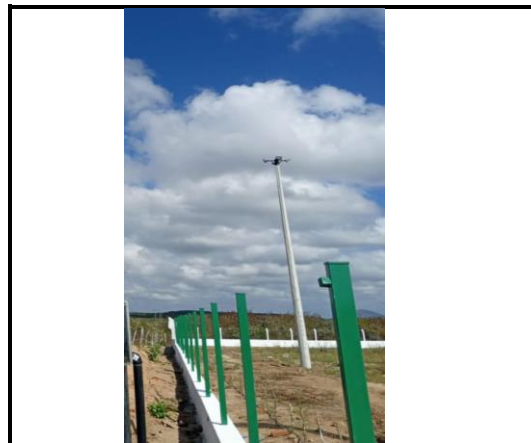

LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE



PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO



PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO



PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016



LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

Documento assinado digitalmente



IAGO ARAUJO BARBOSA

Data: 21/08/2025 14:52:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELTON JOHN
DE SOUSA
NOGUEIRA:0
5311121360

Assinado digitalmente por ELTON
JOHN DE SOUSA
NOGUEIRA:05311121360
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=
27842417000158, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=ELTON JOHN DE SOUSA
NOGUEIRA:05311121360
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0
