



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										VALOR DO CONTRATO	R\$	358.152,95			
											VALOR DO ADITIVO	-R\$	13.546,12			
											VALOR REPLANILHADO	R\$	344.606,83			
											MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R\$	-			
											MEDIÇÃO ATUAL	R\$	60.865,60			
											MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL	R\$	60.865,60			
										SALDO CONTRATUAL	R\$	283.741,23				
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 05/05/2025 A 23/05/2025																
	OBRA:					CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 M2 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE					DATA :		18/07/2024	BDI :		26,87%
	DESCRIÇÃO:					CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7.500 M2 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE					FORTE		VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:					MUNICÍPIO DE PENTECOSTE					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
	CLIENTE:					CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU					SINAPI		2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	

1ª MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE				VALOR			INDICADORES PERCENTUAIS		
					SEM BDI	COM BDI		MEDIDA NO PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDA ACUMULADA	SALDO	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 28.485,02					R\$ 28.485,02	R\$ -	R\$ 28.485,02	100%	0%	100%
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	4,00	R\$ 368,38	R\$ 467,36	R\$ 1.869,44	4,00	-	4,00	-	R\$ 1.869,44	R\$ -	R\$ 1.869,44	6,56%	0,00%	6,56%
1.2	73672.	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	11.954,00	R\$ 0,49	R\$ 0,62	R\$ 7.411,48	11.954,00	-	11.954,00	-	R\$ 7.411,48	R\$ -	R\$ 7.411,48	26,02%	0,00%	26,02%
1.3	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.793,10	R\$ 8,44	R\$ 10,71	R\$ 19.204,10	1.793,10	-	1.793,10	-	R\$ 19.204,10	R\$ -	R\$ 19.204,10	67,42%	0,00%	67,42%
2	CERCAMENTO E DIVISÓRIAS						R\$ 200.865,08					R\$ 32.380,57	R\$ -	R\$ 32.380,57	55%	0%	55%
2.3	74238/002.	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	10,00	R\$ 922,28	R\$ 1.170,10	R\$ 11.701,00	0,00	-	-	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
2.4	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	445,00	R\$ 103,39	R\$ 131,17	R\$ 58.370,65	0,00	-	-	445,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
2.5	C0733	CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ AL	M	305,00	R\$ 283,58	R\$ 359,78	R\$ 109.734,17	90,00	-	90,00	215,00	R\$ 32.380,57	R\$ -	R\$ 32.380,57	55,47%	0,00%	55,47%
2.6	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM	M	40,00	R\$ 280,66	R\$ 356,07	R\$ 14.242,70	0,00	-	-	40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
2.7	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUN	M2	16,00	R\$ 335,80	R\$ 426,04	R\$ 6.816,56	0,00	-	-	16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 66.192,70										
4.1	ESTRADA DE ENERGIA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA						R\$ 34.747,28					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
4.1.1	101490	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 1.323,78	R\$ 1.679,48	R\$ 1.679,48	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	41,62	R\$ 73,66	R\$ 93,45	R\$ 3.889,39	0,00	-	-	41,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4.1.3	96995.	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	41,62	R\$ 44,66	R\$ 56,66	R\$ 2.358,19	0,00	-	-	41,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4.1.4	74166/001.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	R\$ 211,58	R\$ 268,43	R\$ 4.563,31	0,00	-	-	17,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4.1.5	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	199,00	R\$ 21,57	R\$ 27,37	R\$ 5.446,63	0,00	-	-	199,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4.1.6	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	98,00	R\$ 37,05	R\$ 47,01	R\$ 4.606,98	0,00	-	-	98,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4.1.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	R\$ 5,95	R\$ 7,55	R\$ 226,50	0,00	-	-	30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%

ELTON JONH DE SOUSA NOGUEIRA
CPF Nº 053.111.213-60

Assinado de forma digital por ELTON JONH DE SOUSA NOGUEIRA
CPF Nº 053.111.213-60

4.1.8	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	315,00	R\$ 7,79	R\$ 9,88	R\$ 3.112,20	0,00	-	-	315,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4.1.9	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	210,00	R\$ 20,09	R\$ 25,49	R\$ 5.352,90	0,00	-	-	210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4.1.10	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 33,59	R\$ 42,62	R\$ 42,62	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4.1.11	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 292,21	R\$ 370,73	R\$ 370,73	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4.1.12	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	5,00	R\$ 22,99	R\$ 29,17	R\$ 145,85	0,00	-	-	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4.1.13	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	250,00	R\$ 9,31	R\$ 11,81	R\$ 2.952,50	0,00	-	-	250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4.2	ILUMINAÇÃO EXTERNA						R\$ 31.445,42					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
4.2.1	83399.	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 52,17	R\$ 66,19	R\$ 330,95	0,00	-	-	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4.2.2	C4983	LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	5,00	R\$ 4.734,94	R\$ 6.007,22	R\$ 30.036,10	0,00	-	-	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4.2.3	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	R\$ 849,98	R\$ 1.078,37	R\$ 1.078,37	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
8	GUARITA						R\$ 31.126,50										
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.911,48					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
8.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,12	R\$ 52,01	R\$ 65,99	R\$ 2.911,48	0,00	-	-	44,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	FUNDAÇÕES						R\$ 1.561,66					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
8.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2023	M3	1,87	R\$ 73,66	R\$ 93,45	R\$ 174,75	0,00	-	-	1,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.2.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUDO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,01	R\$ 640,98	R\$ 813,21	R\$ 821,34	0,00	-	-	1,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.2.3	C0829	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,86	R\$ 518,36	R\$ 657,64	R\$ 565,57	0,00	-	-	0,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.3	ESTRUTURA						R\$ 2.519,35					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
8.3.1	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	14,00	R\$ 116,65	R\$ 147,99	R\$ 2.071,86	0,00	-	-	14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.3.2	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	2,88	R\$ 122,47	R\$ 155,38	R\$ 447,49	0,00	-	-	2,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.4	PAREDES						R\$ 2.887,13					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
8.4.1	103321	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	20,18	R\$ 110,22	R\$ 139,84	R\$ 2.821,97	0,00	-	-	20,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,03	R\$ 1.712,04	R\$ 2.172,07	R\$ 65,16	0,00	-	-	0,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.5	REVESTIMENTOS DE PAREDE						R\$ 1.443,87					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
8.5.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	10,32	R\$ 100,75	R\$ 127,82	R\$ 1.319,10	0,00	-	-	10,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	10,32	R\$ 9,53	R\$ 12,09	R\$ 124,77	0,00	-	-	10,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.6	PISO						R\$ 5.352,67					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
8.6.1	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	2,09	R\$ 52,05	R\$ 66,04	R\$ 138,02	0,00	-	-	2,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.6.2	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	26,82	R\$ 10,25	R\$ 13,00	R\$ 348,66	0,00	-	-	26,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.6.3	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	2,15	R\$ 763,24	R\$ 968,32	R\$ 2.081,89	0,00	-	-	2,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.6.4	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	26,82	R\$ 23,59	R\$ 29,93	R\$ 802,72	0,00	-	-	26,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%

ELTON JONH DE
 SOUSA NOGUEIRA
 CPF Nº
 053.111.213-60

Assinado de forma
 digital por ELTON JONH
 DE SOUSA NOGUEIRA
 CPF Nº 053.111.213-60

8.6.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	23,94	R\$ 51,90	R\$ 65,85	R\$ 1.576,45	0,00	-	-	23,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.6.6	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	26,82	R\$ 0,61	R\$ 0,77	R\$ 20,65	0,00	-	-	26,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.6.7	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,88	R\$ 95,64	R\$ 121,34	R\$ 349,46	0,00	-	-	2,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.6.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	2,88	R\$ 9,53	R\$ 12,09	R\$ 34,82	0,00	-	-	2,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.7	PINTURA						R\$ 491,59					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
8.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	29,14	R\$ 3,48	R\$ 4,42	R\$ 128,80	0,00	-	-	29,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.7.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	29,14	R\$ 9,81	R\$ 12,45	R\$ 362,79	0,00	-	-	29,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.8	COBERTA						R\$ 3.634,32					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
8.8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	17,36	R\$ 102,09	R\$ 129,52	R\$ 2.248,47	0,00	-	-	17,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.8.2	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	17,36	R\$ 62,92	R\$ 79,83	R\$ 1.385,85	0,00	-	-	17,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.9	ESQUADRIAS						R\$ 2.075,90					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
8.9.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,20	R\$ 281,69	R\$ 357,38	R\$ 428,86	0,00	-	-	1,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.9.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	1,20	R\$ 162,03	R\$ 205,57	R\$ 246,68	0,00	-	-	1,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.9.3	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇÃO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	2,52	R\$ 438,01	R\$ 555,70	R\$ 1.400,36	0,00	-	-	2,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 7.584,22					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
8.10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	R\$ 605,65	R\$ 768,39	R\$ 768,39	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.10.2	C3598	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 243,56	R\$ 309,00	R\$ 309,00	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.10.3	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	1,00	R\$ 54,39	R\$ 69,00	R\$ 69,00	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.10.4	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	R\$ 248,44	R\$ 315,20	R\$ 945,60	0,00	-	-	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.10.5	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	R\$ 231,81	R\$ 294,10	R\$ 882,30	0,00	-	-	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.10.6	C0602	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 628,86	R\$ 797,83	R\$ 797,83	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.10.7	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00	R\$ 3.004,74	R\$ 3.812,10	R\$ 3.812,10										
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 664,31					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
8.11.1	93128.	PONTO DE ILUMINAÇÃO PRESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	R\$ 144,76	R\$ 183,66	R\$ 367,32	0,00	-	-	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.11.2	93141.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00	R\$ 174,11	R\$ 220,89	R\$ 220,89	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
8.11.3	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	2,00	R\$ 29,99	R\$ 38,05	R\$ 76,10	0,00	-	-	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
9	SINALIZAÇÃO INTERNA (COMUNICAÇÃO VISUAL)						R\$ 12.588,05					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
9.1	COMP_RS_04.	SINALIZAÇÃO VERTICAL - BARROTE MADEIRA SIMPLES	UND	15,00	R\$ 81,96	R\$ 103,98	R\$ 1.559,70	0,00	-	-	15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
9.2	COMP_RS_05.	SINALIZAÇÃO VERTICAL - BARROTE MADEIRA DUPLA	UND	4,00	R\$ 155,37	R\$ 197,12	R\$ 788,48	0,00	-	-	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%

ELTON JONH DE
SOUSA NOGUEIRA
CPF Nº
053.111.213-60

Assinado de forma
digital por ELTON JONH
DE SOUSA NOGUEIRA
CPF Nº 053.111.213-60

9.3	C3629	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	M2	10,44	R\$ 773,10	R\$ 980,83	R\$ 10.239,87	0,00	-	-	10,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
10	SISTEMA E PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO						R\$ 5.349,48					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
10.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	5,00	R\$ 777,17	R\$ 986,00	R\$ 4.930,00	0,00	-	-	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
10.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	5,00	R\$ 51,85	R\$ 65,78	R\$ 328,90	0,00	-	-	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
10.3	C4550	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	M2	0,20	R\$ 356,99	R\$ 452,91	R\$ 90,58	0,00	-	-	0,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0,00%	0,00%
						VR TOTAL:	R\$ 344.606,83					R\$ 60.865,60	R\$ 0,00	R\$ 60.865,60	17,66%	0,00%	17,66%

ELTON JONH DE SOUSA
NOGUEIRA CPF Nº 053.111.213-60

Assinado de forma digital por ELTON JONH DE SOUSA NOGUEIRA CPF Nº 053.111.213-60

gov.br

Documento assinado digitalmente
IAGO ARAUJO BARBOSA
Data: 30/05/2025 11:29:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e					Número da Nota 00454												
Data da Emissão		30/05/2025 07:01:49		Competência		05/2025		Cód. Verificação		C1060B981									
RPS Nº				NFS-e substituída				Local da Prestação		PENTECOSTE - CE									
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
		Razão Social/Nome		M A FEITOSA DE SOUSA LTDA															
		CPF/CNPJ		41.356.135/0001-71		Inscrição Municipal		203000306		Inscrição Estadual									
		Município		BOA VIAGEM - CE						CEP		63.870-000							
		Endereço		R JOAO INACIO DE CARVALHO ,000126 - VILA AZUL															
		Complemento		1ºANDAR, SALA 02															
		E-mail		MSCONSTRUCOESBV@GMAIL.COM						Telefone		(88)9688-2269							
DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS																			
Razão Social/Nome		CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU																	
CPF/CNPJ		37.568.608/0001-27				Inscrição Municipal				Inscrição Estadual									
Município		PENTECOSTE - CE								CEP		62.640-000							
Endereço		PC BERNARDINO GOMES BEZERRA ,457 - CENTRO																	
Complemento						Tel.				E-mail									
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS																			
CPF/CNPJ				Razão Social/Nome															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
REF 1º MEDIÇÃO DE UMA CENTRAL MUNICIPAL DE RESIDUOS COM ÁREA DE 7.500 M2 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.																			
CONTRATO Nº 2024101501																			
PERIODO DA MEDIÇÃO 05/05/2025 Á 23/05/2025																			
VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 60.865,60																			
VALOR DA MAO DE OBRA 30% R\$ 18.259,68																			
VALOR DO MATERIAL 70% R\$ 42.605,92																			
M A FEITOSA DE SOUSA ME EPP																			
AG: 153																			
C/C: 045758-9																			
BANCO DO NORDESTE																			
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE																			
439910301-OBRAS DE ALVENARIA																			
07.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E																			
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL																			
Descrição da Obra									Código ART										
TRIBUTOS FEDERAIS																			
PIS(R\$)		0,00		COFINS(R\$)		0,00		IRRF(R\$)		730,39		INSS(R\$)		2.008,56		CSLL(R\$)		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços								Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços(R\$)				60.865,60				Natureza Operação				Valor dos Serviços(R\$)				60.865,60			
(-)Desconto Incondicionado(R\$)				0,00				Tributação Fora do Município				(-)Deduções Permitidas em Lei(R\$)				42.605,92			
(-)Desconto Condicionado(R\$)				0,00				Regime Especial de Tributação				(-)Desconto Incondicionado(R\$)				0,00			
(-)Retenções Federais(R\$)				2.738,95				Microempresa (ME EPP)				Base de Cálculo(R\$)				18.259,68			
(-)Outras Retenções(R\$)				0,00				Opção Simples Nacional				(X)Alíquota %				5,00			
(-)ISS Retido(R\$)				912,98				Não				ISS a reter				(X) Sim () Não			
(=)Valor Líquido(R\$)				57.213,67								(=)Valor do ISS(R\$)				912,98			
Avisos		Esta Nota Fiscal foi emitida com respaldo na Lei Nº 1.353 de 20 de Dezembro de 2017. Para validar a nota acesse: https://boaviagem.ssinformatica.net/nfe/validar																	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU

EMPRESA EXECUTANTE: FEITOSA DE SOUSA LTDA

CNPJ: 41.356.135/0001-71

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE RESÍDUOS COM ÁREA DE 7500 M2 NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO



PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER




DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS



DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS



DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

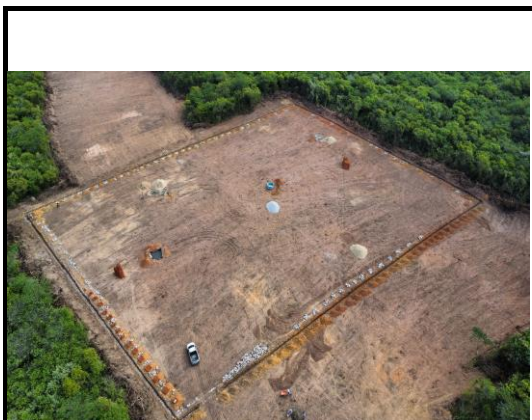

CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES



CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES

ELTON JONH DE SOUSA NOGUEIRA
CPF Nº 053.111.213-60

Assinado de forma digital por ELTON JONH DE SOUSA NOGUEIRA
CPF Nº 053.111.213-60



CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES



CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES



CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES



CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS,MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES

ELTON JONH DE SOUSA
NOGUEIRA CPF Nº 053.111.213-60

Assinado de forma digital por ELTON JONH DE SOUSA NOGUEIRA CPF Nº 053.111.213-60



Documento assinado digitalmente

IAGO ARAUJO BARBOSA

Data: 30/05/2025 11:34:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

